

	Rimozione Costa Concordia Relazione Settimanale	Rev.0	Pag. 1/34
---	--	--------------	-----------

Redatta da: Costa Crociere	Luogo: Isola del Giglio	Data: 02/11/2013
Destinatari: Osservatorio di monitoraggio		
Titolo: Rapporto settimanale per Osservatorio di monitoraggio		

Attività svolte – Isola del Giglio, 26 ottobre – 01 novembre

26/10/2013:

Cantieristica

Continuano attività di caretaking (gestione e manutenzione panne, controlli antinquinamento); varie attività di carpenteria sul ponte della Micoperi 61; moto pontone Vincenzo Cosentino in area di lavoro, continuano operazioni di installazione catene sotto la nave; pontone Navalmare 2 in area di lavoro; pontone Micoperi 30 in area di lavoro, continuano operazioni di rimozione martinetti e cavi di collegamento martinetti sui cassoni, completata installazione dei 12 supporti tubolari di collegamento tra cassoni e piattaforma 2; pontone Micourier 1 rimorchiato da rimorchiatore Buccaneer arriva a Livorno per trasferimento 4 cassoni di spinta; pontone ASV Pioneer e Liguria 1 in area di lavoro, continuano operazioni di posizionamento grout bags e stoppers sul fondale al lato destro della Costa Concordia, continua preparazione per grouting dei bracci diagonali della piattaforma 3; E.R. Narvik a Piombino per imbarco materiale.

Ambientale

Oggi il monitoraggio giornaliero è stato effettuato regolarmente, ma senza l'acquisizione di dati di corrente a causa dello stato del mare: tutti i controlli sono risultati nella norma. L'irradianza ha tutti i valori superiori (maggiori o uguali a $39 \mu\text{M m}^{-2} \text{s}^{-1}$) alla soglia minima di allarme ($37 \mu\text{M m}^{-2} \text{s}^{-1}$). Temperatura dell'acqua pari a $21,5\text{-}22^\circ\text{C}$ in superficie, termocline intorno ai 30 m di profondità.

Prosegue il consueto monitoraggio dei rumori e dei mammiferi marini, che, oggi, ha interessato le stazioni 2 (posta a 250 m di distanza dalla Concordia) e 9 (a 500 m di distanza dalla Concordia). Il valore di mean SPL oggi è superiore al limite di 120 dB alle profondità di 20 e 30 m a causa del traffico navale. Valori di SPL peak nella banda di frequenza tra 10-1000 Hz generalmente inferiori al limite di 180 per pericolo fisico ai cetacei ma superiori al limite di 160 dB per pericolo sugli effetti comportamentali a tutte le profondità e stazioni. Il valore di SPL rms per le basse frequenze è inferiore al limite di 180 dB e a quello di 160 dB a tutte le profondità e stazioni. L'avvistamento di mammiferi marini oggi si è protratto per 5 ore dall'imbarcazione. Nessun cetaceo è stato avvistato. Gli addetti al monitoraggio delle correnti per questa settimana sono la Dr.ssa Laura Cutroneo e il Dr. Marco Capello. Gli osservatori MMO sono la Dr.ssa Monica Mariani e il Dr. Giancarlo Giacomini.



Rimozione Costa Concordia

Relazione Settimanale

Rev.0

Pag. 2/34

27/10/2013:

Cantieristica

Continuano attività di caretaking (gestione e manutenzione panne, controlli antinquinamento); varie attività di carpenteria sul ponte della Micoperi 61; moto pontone Vincenzo Cosentino in area di lavoro, continuano operazioni di installazione catene sotto la nave; pontone Navalmare 2 in area di lavoro; pontone Micoperi 30 in area di lavoro, completate operazioni di rimozione martinetti e cavi di collegamento martinetti sui cassoni, avviata installazione supporti tubolari di collegamento tra cassoni e piattaforma 3; pontone ASV Pioneer e Liguria 1 in area di lavoro, continuano operazioni di posizionamento grout bags e stoppers sul fondale al lato destro della Costa Concordia, continua preparazione per grouting dei bracci diagonali della piattaforma; E.R. Narvik in area di lavoro per trasferimento materiale.

Ambientale

Oggi il monitoraggio giornaliero è stato effettuato regolarmente, ma senza l'acquisizione di dati di corrente a causa delle condizioni meteomarine (vento teso a 36 km h⁻¹, con raffiche di vento fresco a 44 km h⁻¹ e onda da SE di 80-100 cm): tutti i controlli sono risultati nella norma. In alcune stazioni l'irradianza ha valori inferiori (32 $\mu\text{M m}^{-2} \text{s}^{-1}$) alla soglia minima di allarme (37 $\mu\text{M m}^{-2} \text{s}^{-1}$) a causa della copertura nuvolosa.

Causa le condizioni meteo, oggi il monitoraggio acustico non è stato effettuato. Il monitoraggio visivo dei cetacei è stato effettuato per 3 ore dalla imbarcazione. Nessun cetaceo è stato avvistato.

Immersioni subacquee con rilievi video in HD sui fondali lasciati scoperti dopo il parbuckling per valutare la situazione.

28/10/2013:

Cantieristica

Continuano attività di caretaking (gestione e manutenzione panne, controlli antinquinamento); varie attività di carpenteria sul ponte della Micoperi 61; moto pontone Vincenzo Cosentino in area di lavoro, continuano operazioni di installazione catene sotto la nave; pontone Navalmare 2 in area di lavoro; pontone Micoperi 30 in area di lavoro, continua installazione supporti tubolari di collegamento tra cassoni e piattaforme 1 e 3; pontone ASV Pioneer e Liguria 1 in area di lavoro, continuano operazioni di posizionamento grout bags e stoppers sul fondale al lato destro della Costa Concordia, avviato grouting dei bracci diagonali delle piattaforme; E.R. Narvik in area di lavoro per trasferimento materiale.

Ambientale

Oggi il monitoraggio giornaliero è stato effettuato regolarmente, ma senza l'acquisizione di dati di corrente a causa delle condizioni meteomarine (vento teso a 32 km h⁻¹, con raffiche di vento fresco a 48 km h⁻¹ e onda da S-SE di 80-100 cm): tutti i controlli sono risultati nella norma. In alcune stazioni l'irradianza ha valori inferiori (32 $\mu\text{M m}^{-2} \text{s}^{-1}$) alla soglia minima di allarme (37 $\mu\text{M m}^{-2} \text{s}^{-1}$) a causa, anche oggi, della copertura nuvolosa.

Causa le condizioni meteo, oggi il monitoraggio acustico non è stato effettuato. Il monitoraggio visivo dei cetacei è stato effettuato per 3 ore dalla imbarcazione. Nessun cetaceo è stato avvistato.

Immersione subacquei con rilievi video in HD sui fondali lasciati scoperti dopo il parbuckling per valutare la situazione.



Rimozione Costa Concordia

Relazione Settimanale

Rev.0

Pag. 3/34

29/10/2013:

Cantieristica

Continuano attività di caretaking (gestione e manutenzione panne, controlli antinquinamento); varie attività di carpenteria sul ponte della Micoperi 61; moto pontone Vincenzo Cosentino in area di lavoro, continua installazione di catene sotto la nave, avviata preparazione per installazione bilge plates sul lato destro della Costa Concordia; pontone Navalmare 2 in area di lavoro; pontone Micoperi 30 in area di lavoro, continua installazione supporti tubolari di collegamento tra cassoni e piattaforme 1 e 3; pontone ASV Pioneer e Liguria 1 in area di lavoro, continuano operazioni di posizionamento grout bags e stoppers sul fondale al lato destro della Costa Concordia, continua grouting dei bracci diagonali delle piattaforme; E.R. Narvik in area di lavoro per trasferimento materiale.

Ambientale

Oggi il monitoraggio giornaliero non è stato effettuato regolarmente a causa delle condizioni meteomarine (vento teso a 36 km h-1, con raffiche di vento forte a 54 km h-1 e onda da S-SE con più di 1 m di altezza). Solo una stazione (#22) è stata effettuata ed i valori sono risultati nella norma, con valori di irradianza superiori (88 $\mu\text{M m}^{-2} \text{s}^{-1}$) alla soglia minima di allarme (37 $\mu\text{M m}^{-2} \text{s}^{-1}$).

Causa le condizioni meteo, oggi il monitoraggio acustico non è stato effettuato. Il monitoraggio visivo dei cetacei è stato effettuato per 1,5 ore dalla imbarcazione. Nessun cetaceo è stato avvistato.

Immersioni subacquee con rilievi video in HD sui fondali lasciati scoperti dopo il parbuckling per valutare la situazione.

30/10/2013:

Cantieristica

Continuano attività di caretaking (gestione e manutenzione panne, controlli antinquinamento); varie attività di carpenteria sul ponte della Micoperi 61; moto pontone Vincenzo Cosentino in area di lavoro, continua installazione catene sotto la nave, avviata installazione rinforzi della carena (bilge plates) sul lato destro della Costa Concordia; pontone Navalmare 2 in area di lavoro; pontone Micoperi 30 in area di lavoro, continua installazione supporti tubolari di collegamento tra cassoni e piattaforme 1 e 3; pontone ASV Pioneer e Liguria 1 in area di lavoro, continuano operazioni di posizionamento grout bags e stoppers sul fondale al lato destro della Costa Concordia, continua grouting dei bracci diagonali delle piattaforme, completato grouting dei supporti tubolari della piattaforma 2; E.R. Narvik in area di lavoro per trasferimento materiale.

Ambientale

Oggi il monitoraggio giornaliero è stato effettuato regolarmente, ma senza l'acquisizione di dati di corrente a causa delle condizioni meteomarine (vento moderato a 25 km h-1, con raffiche di vento teso a 34 km h-1): tutti i controlli sono risultati nella norma. In alcune stazioni l'irradianza ha valori inferiori (maggiori o uguali a 23 $\mu\text{M m}^{-2} \text{s}^{-1}$) alla soglia minima di allarme (37 $\mu\text{M m}^{-2} \text{s}^{-1}$) a causa della copertura nuvolosa.

Causa le condizioni meteo, oggi il monitoraggio acustico e visivo dei cetacei non è stato effettuato.



Rimozione Costa Concordia

Relazione Settimanale

Rev.0

Pag. 4/34

31/10/2013:

Cantieristica

Continuano attività di caretaking (gestione e manutenzione panne, controlli antinquinamento); varie attività di carpenteria sul ponte della Micoperi 61; moto pontone Vincenzo Cosentino in area di lavoro, continua installazione di catene sotto la nave, continua installazione rinforzi della carena (bilge plates) sul lato destro della Costa Concordia; pontone Navalmare 2 in area di lavoro; pontone Micoperi 30 in area di lavoro, completata installazione supporti tubolari di collegamento tra cassoni e piattaforma 1; pontone ASV Pioneer e Liguria 1 in area di lavoro, continuano operazioni di posizionamento grout bags e stoppers sul fondale al lato destro della Costa Concordia, continua grouting dei bracci diagonali delle piattaforme; E.R. Narvik in area di lavoro per trasferimento materiale.

Ambientale

Il monitoraggio giornaliero è stato effettuato regolarmente, ma senza l'acquisizione di dati di corrente a causa dello stato del mare (onda lunga da SE di 80-100 cm): tutti i controlli sono risultati nella norma. In alcune stazioni l'irradianza ha valori inferiori (maggiori o uguali a $26 \mu\text{M m}^{-2} \text{s}^{-1}$) alla soglia minima di allarme ($37 \mu\text{M m}^{-2} \text{s}^{-1}$) a causa della copertura nuvolosa.

Causa le condizioni meteo, oggi il monitoraggio acustico non è stato effettuato. Il monitoraggio visivo dei cetacei è stato effettuato per 4,5 ore dalla imbarcazione. Nessun cetaceo è stato avvistato.

01/11/2013:

Cantieristica

Continuano attività di caretaking (gestione e manutenzione panne, controlli antinquinamento); varie attività di carpenteria sul ponte della Micoperi 61; moto pontone Vincenzo Cosentino in area di lavoro, continua installazione di catene sotto la nave, continua installazione rinforzi della carena (bilge plates) sul lato destro della Costa Concordia; pontone Navalmare 2 in area di lavoro; pontone Micoperi 30 in area di lavoro, continua installazione supporti tubolari di collegamento tra cassoni e piattaforma 3; pontone ASV Pioneer e Liguria 1 in area di lavoro, continuano operazioni di posizionamento grout bags e stoppers sul fondale al lato destro della Costa Concordia, continua grouting dei bracci diagonali delle piattaforme, completato grouting dei supporti tubolari sulla piattaforma 1; E.R. Narvik in area di lavoro per trasferimento materiale.

Ambientale

Il monitoraggio giornaliero è stato effettuato regolarmente: tutti i controlli sono risultati nella norma. In alcune stazioni l'irradianza ha valori inferiori (maggiori o uguali a $26 \mu\text{M m}^{-2} \text{s}^{-1}$) alla soglia minima di allarme ($37 \mu\text{M m}^{-2} \text{s}^{-1}$) a causa della copertura nuvolosa.

Causa le condizioni meteo, oggi il monitoraggio acustico non è stato effettuato. Il monitoraggio visivo dei cetacei è stato effettuato per 1,5 ore dalla imbarcazione. Nessun cetaceo è stato avvistato.



Rimozione Costa Concordia
Relazione Settimanale

Rev.0

Pag. 5/34

Attività previste – Isola del Giglio 26 ottobre – 1 novembre

Attività cantieristica

Continua attività caretaking di gestione e manutenzione panne e controlli antinquinamento. Continuano posizionamento grout stopper e passaggio catene sotto la nave. Continua installazione supporti tubolari di collegamento tra piattaforma 3 e cassoni.

Attività ambientale aerea

Prosecuzione campagna di monitoraggio Qualità dell’Aria.
Invio dati Qualità dell’Aria.

Attività ambientale marina

È previsto il proseguimento dei rilievi delle correnti e dei sedimenti sospesi nella colonna d’acqua mediante ADCP portatile, secondo il piano adottato. È previsto il proseguimento dei rilievi sui rumori subacquei e l’avvistamento dei mammiferi marini. Previsti rilievi subacquei sui fondali lasciati scoperti dopo il parbuckling.

	Rimozione Costa Concordia Relazione Settimanale	Rev.0	Pag. 6/34
---	--	--------------	-----------

Problematiche, rischi, note di carattere generale:

Le operazioni di lavoro sono proseguite regolarmente durante la settimana; la rimozione dei martinetti dai cassoni utilizzati per il raddrizzamento della Costa Concordia è completata, mentre continuano le operazioni incluse nella fase WP6bis, tra cui il posizionamento dei grout stopper sul fondale sul lato di dritta della Costa Concordia, il passaggio delle catene sotto la nave e l'installazione dei supporti tubolari tra i cassoni e le piattaforme, già completata per due delle tre piattaforme (piattaforma 1 e piattaforma 2).

È stato nel frattempo avviato il grouting dei bracci diagonali delle piattaforme (già completato per la piattaforma 2) e l'installazione dei rinforzi della carena (bilge plates) sulle parti danneggiate della fiancata destra della nave, al fine di permettere il passaggio delle catene prevenendo danni al ginocchio.



Rimozione Costa Concordia

Relazione Settimanale

Rev.0

Pag. 7/34

Previsioni meteorologiche per il periodo 02-08 novembre 2013

Emissione: Venerdì 01 novembre

Sabato 2 Novembre 2013

stato del cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso con locali piogge nella prima parte della giornata.

vento: moderato di Scirocco al mattino, ma tendente a Libeccio dal pomeriggio/sera.

mare: mosso al mattino, con temporanea attenuazione del moto ondoso dal pomeriggio.

temperature: stazionarie.

Domenica 3 Novembre 2013

stato del cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso.

vento: moderati o forti di Libeccio con raffiche, dal pomeriggio/sera tendente a divenire temporaneamente di Maestrale.

mare: da poco mosso a mosso a Giglio Porto, molto mosso nel canale e sui versanti dell'isola esposti al Libeccio.

temperature: stazionarie.

Lunedì 4 Novembre 2013

stato del cielo e fenomeni: molto nuvoloso con piogge dal pomeriggio.

vento: in mattinata deboli/moderati di Libeccio in intensificazione fino a forti dal pomeriggio.

mare: da poco mosso a mosso a Giglio Porto, molto mosso nel canale e sui versanti dell'isola esposti al Libeccio.

temperature: in calo.

Martedì 5 Novembre 2013

stato del cielo e fenomeni: molto nuvoloso con piogge al mattino, ma con graduale miglioramento dal pomeriggio/sera.

vento: di maestrale da moderato a forte.

mare: mosso o moin ulteriore lieve calo.

Mercoledì 6 Novembre 2013

stato del cielo e fenomeni: poco nuvoloso.

vento: debole meridionale.

mare: da poco mosso a mosso.

Temperature: in aumento.

Giovedì 7 Novembre 2013

stato del cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso.

vento: moderato di Scirocco, tendente a disporsi da sud-sud ovest dal pomeriggio.

mare: mosso in mattinata

temperature: in lieve aumento.

Venerdì 8 Novembre 2013

stato del cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso.

vento: deboli variabili

mare: poco mosso.

temperature: stazionarie

	Rimozione Costa Concordia Relazione Settimanale	Rev.0	Pag. 8/34
---	--	--------------	-----------

Presenze (al 01 novembre):

Totale persone coinvolte nel progetto attualmente all'Isola del Giglio **462**, di cui:

- a bordo dei mezzi navali: **273**
- a terra: **189**

NOTE:

In allegato le note settimanali relative al rumore sottomarino e monitoraggio cetacei

ALLEGATI:

- ALL.1 - Glossario
- ALL.2 - Tabella lista mezzi e loro impiego
- ALL.3 - Lista documenti inviati all'Osservatorio
- ALL.4 - Foto
- ALL.5 - Note settimanali rumore sottomarino e monitoraggio cetacei

ALLEGATO 1

GLOSSARIO	
MMO	Marine Mammal Observer
FTU	Formazin Turbidity Unit
dB	Decibel
ppb	Parte per bilione
SPL	Sound Pressure Level
mean SPL	SPL mediato sull'intero spettro campionato
SPL peak	SPL in ciascuna delle 4 bande di frequenza dello spettro
SPL rms	SPL nelle prime 3 bande di frequenza dello spettro
EZ	Zona di Esclusione (o area di sicurezza) per i cetacei
ADCP	Acoustic Doppler Current Profiler



Rimozione Costa Concordia

Relazione Settimanale

Rev.0

Pag. 10/34

ALLEGATO 2

UNITA'	ATTIVITA'	NOTE
M/P Vincenzo Cosentino	Livellamento fondale, grouting anchor block per sistema di ritenuta	
Pontone Micoperi 30	Attività varie di sollevamento pesante, trivellazioni lato mare	
Pontone d'appoggio Micoperi 61	Logistica, attività supporto caretaking, attività di carpenteria varie	
Pontone Micourier 1	Imbarco equipaggiamenti e materiali	
Pontone Micourier 2	Imbarco equipaggiamenti e materiali	
Pontone Navalmare 2	Equipaggiato con mezzi Trevi	
M/N Green Salina	Trasporto equipaggiamenti e materiali	
Rim.re Punta Penna	In assistenza	
Rim.re Voe Earl	Attività di supporto, assistenza Micoperi 30	
Rim.re Sarom Otto	Attività di supporto ai sommozzatori	
Rim.re Afon Cefni	Attività di supporto ed assistenza mezzi maggiori	
Rim.re Aran	In assistenza al pontone Micourier 2	
Rim.re Voe Venture	Attività di supporto ed assistenza mezzi maggiori	
Rim.re Snipe	Attività di supporto, assistenza Micoperi 30	
Rim.re Buccaneer	In assistenza al pontone Micourier 1	
Consorzio Giglio	Piccole imbarcazioni per attività di caretaking, gestione e manutenzione panne, skimming	
Pontone Liguria 1	Appoggio, stivaggio materiale, supporto	
Spirit	Attività di monitoraggio Università di Roma	
Pontone Pioneer	Posizionamento grout bags, imbarcazione di supporto divers	
Narvik	Attività di supporto, trasporto cemento per grout bags	
Eupontos 3, Eupontos 4	Attività di supporto caretaking	
M/N Acqua Azzurra	Attività di supporto caretaking	

	Rimozione Costa Concordia Relazione Settimanale	Rev.0	Pag. 11/34
---	--	--------------	-------------------

ALLEGATO 3

	DOCUMENTAZIONE INVIATA ALL'OSSERVATORIO		
DATA DI INVIO	TITOLO	DOCUMENTO DI PRESCRIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI	DOCUMENTO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AVVIO FASI WP
21/06/12	Cronoprogramma - diagramma di Gantt	X	
15/07/12	Presentazione T/M Osservatorio 03 luglio	X	
	Presentazione Uniroma Osservatorio 03 luglio	X	
	Dettaglio planning stabilizzazione rev.12/07/12	X	
	Cronoprogramma generale agosto del 12/07/12	X	
	Stato avanzamento lavori - Uniroma al 13/07/2012	X	
21/07/12	Piano di monitoraggio ambientale per ARPAT e ISPRA	X	
22/07/12	Carta biocenosi Uniroma	X	X
	Stato avanzamento lavori - Uniroma	X	X
	TMCC - WP3 Manuale Operativo Rev.1	X	X
24/07/12	Stato avanzamento attività in campo ambientale - Uniroma	X	X
26/07/12	12-343-H4 Rev.0 (monitoraggio acustico)	X	
	12-343-H7 Rev.0 (Identificazione Pericoli Ambientali e Analisi Qualitativa del Rischio Ambientale e allegati 1, 2 e 3)	X	X
	12-343-H6 Rev.0 (Studio dispersione in atmosfera di inquinanti fase WP3)	X	X
	12-343-H5 Rev.0 (monitoraggio della qualità dell'aria)	X	



Rimozione Costa Concordia
Relazione Settimanale

Rev.0

Pag. 12/34

26/07/12	Appendice A Indagine sulla Qualità aria presso Isola Giglio	X	
30/07/12	TMCC - WP3 Manuale Operativo Rev.2	X	X
02/08/12	tmcc - wp3 manuale operativo_v3	X	X
	CCTM-PLN-001-Caretaking plan - rev.00	X	
	CCTM Vessel waste removal plan - rev 00	X	
	CCTM-PRO-MAR-001-Piano d'ormeggio - rev 00	X	X
11/08/12	relazione settimanale 03-10 agosto		
13/08/12	TMCC-MA-LIS-stabilization holdback timeline rev. 10/08/12	X	
	General Gantt Chart rev.01 al 13/08/12	X	
16/08/12	Report turbidity and irradiance baseline al 14/08/12	X	
18/08/12	Relazione settimanale 11-17 agosto		
	Certificato assenza ordigni bellici (allegato relazione settimanale)	X	
	Monitoraggio qualità acqua 16 e 17 agosto (allegato alla relazione settimanale)	X	
25/08/12	Relazione settimanale 18-24 agosto		
	Dati qualità dell'aria al 23 agosto (allegato relazione settimanale)	X	
27/08/12	Report dati rumore sottomarino e monitoraggio cetacei	X	
	Report dati qualità acqua (torbidità-irradianza-correnti)	X	
	12-343-H11 studio della propagazione (onda impulsiva)	X	

27/08/12	12-343-H12 rilievo naturalistico delle aree a terra - primo data report	X	
30/08/12	Dati qualità dell'aria al 29 agosto	X	
	Rettifica CO_23_08_2012	X	
01/09/12	Relazione settimanale 25-31 agosto		
07/09/12	Dati QA al 06 settembre	X	
08/09/12	Relazione settimanale 01-07 settembre		
	12-343-H17 Bianco qualità aria 29 giu – 12 lug rev.0	X	
	12-343-H16 Rilievi naturalistici rev.0	X	
	Dati qualità acqua e correnti	X	
10/09/12	Relazione denominata WP4a	X	X
	Relazione denominata WP4b	X	X
	Elaborato grafico WP4a	X	X
	Elaborato grafico WP4b	X	X
	Aggiornamento relazione ambientale - 06-09-12+MI070912	X	X
	12-343-H10_rev0 studio dispersione inquinanti in atmosfera	X	X
	12-343-H13 rev0 valutazione di impatto acustico fasi WP4 e WP5	X	X
	12-343-H7 rev1 Doc rischi ambientale	X	X
15/09/12	Relazione settimanale 08-14 settembre		
18/09/12	intergrazioni Osservatorio 17_09_12	X	X
22/09/12	Relazione settimanale 15-21 settembre		
29/09/12	Relazione settimanale 22-28 settembre		

01/10/12	WP 3 del 1 Ottobre rev.0		
02/10/12	AB 1 (documentazione fotografica)		
	foto AB 2 (documentazione fotografica)		
	Allegati al documento WP3 del 1 ottobre (status lavori e tempistiche)		
06/10/12	Relazione settimanale 29 settembre-05 ottobre		
10/10/12	12-343-H7 rev.2 Identificazione pericoli ambientali ed analisi qualitativa del rischio	X	X
13/10/12	Relazione settimanale 06 ottobre-12 ottobre		
14/10/12	Relazione denominata WP4-C	X	X
20/10/12	Relazione settimanale 13 ottobre-19 ottobre		
21/10/12	Integrazioni alla relazione WP4c per l'Osservatorio		X
	Grafici sacchi grout bags		X
	TMCC-MA-LIS Groutbags timeline		X
26/10/12	Precisazione alla relazione integrative		X
	Scheda tecnica cemento		X
28/10/12	Relazione settimanale 20 ottobre-26 ottobre		
31/10/12	Addendum all'analisi di rischio ambientale relativo alla fase WP4-c (12-343-H24_rev0)	X	X
	Piano di monitoraggio delle acque interne della Costa Concordia	X	
03/11/12	Relazione settimanale 27 ottobre-02 novembre		
10/11/12	Relazione settimanale 03-09 novembre		
17/11/12	Relazione settimanale 10-16 novembre		
24/11/12	Relazione settimanale 17-23 novembre		

	Dati orari QA	X	
	12-343-H18_rev1 Piano Monitoraggio Qualità Aria	X	
25/11/12	Caretaking plan rev. 3		
26/11/12	Relazione denominata WP4b rev.1		X
	Report esplosione 16/11/2012		X
	16.11.2012 Green Break Cartridge Test Water-monitoring report		X
	12-343-H21_rev0 (simulazioni numeriche della propagazione e di vibrazioni indotte dall'utilizzo di esplosivi per il livellamento del Fondo Marino)		X
29/11/12	Comunicazione di conclusione dei test effettuati con l'utilizzo del "green break technology"		X
01/12/12	Relazione settimanale 24-30 novembre		
	Dati orari QA	X	
08/12/12	Relazione settimanale 01-07 dicembre		
	Dati orari QA	X	
	Report monitoraggio movimenti nave	X	
	Report monitoraggio qualità dell'acqua dal 1 al 7 dicembre		
11/12/12	Grafico casseforme		X
	Relazione Uniroma		X
	Comunicazione Osservatorio Cofferdam		X
13/12/12	Richiesta autorizzazione fase WP5		X
	12-343-H29_REV.0 (Addendum 2 al rapporto di analisi di rischio)		X
	WP5 metodi e sequenze di installazione, con allegati		X



Rimozione Costa Concordia
Relazione Settimanale

Rev.0

Pag. 16/34

15/12/12	Relazione settimanale 08-14 dicembre		
	Dati orari QA	X	
	Report monitoraggio movimenti nave	X	
	Report monitoraggio qualità dell'acqua dal 8 al 14 dicembre		
	12-343-H28_rev0 Relazione mensile attività di monitoraggio QA	X	
	12-343-H30 Rev0 Rilievo naturalistico in corso d'opera (19-22 novembre 2012)	X	
18/12/12	Integrazione Green Break		X
	Report previsione esplosione 20 cariche GBR_16.12.2012		X
22/12/12	Relazione settimanale 15-21 dicembre		
	Dati orari QA	X	
	Report monitoraggio movimenti nave	X	
29/12/12	Relazione settimanale 22-28 dicembre		
	Dati orari QA	X	
	Report monitoraggio movimenti nave	X	
05/01/12	Relazione settimanale 29 dicembre-04 gennaio		
	Dati orari QA	X	
	Report monitoraggio movimenti nave	X	
08/01/13	Caretaking rev.04	X	
12/01/13	Relazione settimanale 05 -11 gennaio		
	Dati orari QA	X	
	Report monitoraggio movimenti nave	X	
	12-343-H31 Rev0 Relazione naturalistica	X	



Rimozione Costa Concordia
Relazione Settimanale

Rev.0

Pag. 17/34

	campagna CO (gennaio 2013)		
19/01/13	Relazione settimanale 12 -18 gennaio		
	Dati orari QA	X	
	Report monitoraggio movimenti nave	X	
	Report settimanale monitoraggio qualità dell'acqua		
19/01/13	Richiesta utilizzo "calcestruzzo"		X
22/01/13	Comunicazione variazione del gel consolidante "water glass"		X
26/01/13	Relazione settimanale 19 -25 gennaio		
	Dati orari QA	X	
	Report monitoraggio movimenti nave	X	
	Report settimanale monitoraggio qualità dell'acqua		
02/02/13	Relazione settimanale 26 gennaio – 01 febbraio		
	Dati orari QA	X	
	Report monitoraggio movimenti nave	X	
	Report settimanale monitoraggio qualità dell'acqua		
	12-343-H34_rev0 Report monitoraggio QA Dicembre 2012		
06/02/13	Comunicazione procedura di trivellazione foro DH3 piattaforma 1		
09/02/13	Relazione settimanale 02-08 febbraio		
	Dati orari QA	X	
	Report monitoraggio movimenti nave	X	
	Report settimanale monitoraggio qualità dell'acqua	X	



Rimozione Costa Concordia
Relazione Settimanale

Rev.0

Pag. 18/34

15/02/13	Aggiornamento a chiusura della comunicazione del 13/02		
16/02/13	Relazione settimanale 09-15 febbraio		
	Dati orari QA	X	
	Report monitoraggio movimenti nave	X	
	Report settimanale monitoraggio qualità dell'acqua	X	
22/02/13	12-343-H14_rev0 Reinvio a seguito controllo di Relazione "Rilievo dello Stato di Consistenza dei Beni Tutelati Potenzialmente Interessati dalle Operazioni di Rimozione del Relitto	X	
23/02/13	Relazione settimanale 16-22 febbraio ed allegati	X	
28/02/13	Comunicazione rimodulazione delle opere di trivellazione per i lavori di rimozione		X
02/03/13	Relazione settimanale 23 febbraio - 01 marzo ed allegati	X	
	12-343-H35_rev0 Report monitoraggio QA Gennaio 2013		
04/11/12	Caretaking Plan rev. 5		
09/03/13	Relazione settimanale 02-08 marzo ed allegati	X	
14/03/13	Integrazione richiesta utilizzo green break		X
16/03/13	Relazione settimanale 09-15 marzo ed allegati	X	
18/03/13	Presentazioni Osservatorio del 5/03/13 e relazione sedimenti		
23/03/13	Relazione settimanale 16-22 marzo ed allegati	X	
30/03/13	Relazione settimanale 23-29 marzo ed allegati	X	
	12-343-H36_rev0 Report monitoraggio QA febbraio 2013		



Rimozione Costa Concordia
Relazione Settimanale

Rev.0

Pag. 19/34

06/04/13	Relazione settimanale 30 marzo-05 aprile ed allegati	X	
13/04/13	Relazione settimanale 06-12 aprile ed allegati	X	
16/04/13	Procedure operative fasi aggiornate al 14/04/13		X
20/04/13	Relazione settimanale 13-19 aprile ed allegati	X	
27/04/13	Relazione settimanale 20-26 aprile ed allegati	X	
	Relazione sintetica seconda campagna acque interne e presentazioni incontro con la popolazione del 20 aprile	X	
29/04/13	Cronoprogramma installazione piattaforme 2 e 3	X	
04/05/13	Relazione settimanale 27 aprile-3 maggio ed allegati	X	
	12-343-H37_rev0 Report monitoraggio QA Marzo 2013	X	
06/05/13	OSSDH8 Comunicazione procedura trivellazione foro DH8 per piattaforma 2		X
10/05/13	Invio presentazioni ambientali dell'incontro osservatorio 2 maggio		
11/05/13	Relazione settimanale 04-10 maggio ed allegati	X	
13/05/13	Report monitoraggio utilizzo tecnologia Green Break		X
15/05/13	Aggiornamento manuali operativi fasi WP4a e WP4b ed allegati		X
18/05/13	Relazione settimanale 11-17 maggio ed allegati	X	
	Aggiornamento PGAI e allegati	X	
25/05/13	Relazione settimanale 18-24 maggio ed allegati	X	
01/06/13	Relazione settimanale 25-31 maggio ed allegati	X	
	12-343-H38_rev0 Misurazioni Dinamiche - Perforazione pali grande diametro	X	
	12-343-H39_rev0 Report monitoraggio QA Aprile 2013	X	



Rimozione Costa Concordia
Relazione Settimanale

Rev.0

Pag. 20/34

04/06/13	TMCC-WP3 MANUALE OPERATIVO rev 03 e comunicazione all'Osservatorio		X
05/06/13	TMCC-WP3 MANUALE OPERATIVO rev 4 e comunicazione errata corregge all'Osservatorio		X
07/06/13	Invio presentazioni Osservatorio 20 maggio e relazione Uniroma		
08/06/13	Relazione settimanale 01-07 giugno ed allegati	X	
15/06/13	Relazione settimanale 08-14 giugno ed allegati	X	
22/06/13	Relazione settimanale 15-21 giugno ed allegati	X	
	12-343-H40_rev0 Data report prima uscita rilievo naturalistico CO 2013	X	
24/06/13	Caratterizzazione sedimenti area cantiere Costa Concordia	X	
29/06/13	Relazione settimanale 22-28 giugno ed allegati	X	
	12-343-H41_rev0_Report Monitoraggio QA_Maggio 2013.pdf		X
06/07/13	Relazione settimanale 29 giugno – 05 luglio ed allegati	X	
13/07/13	Relazione settimanale 06-12 luglio ed allegati	X	
17/07/13	Manuale WP6 ed allegati	X	X
18/07/12	Documento Valutazione dei Rischi fase WP6		X
	Report Esplosione Green Break 19 06 2013	X	
	Mammiferi Marini e Rumore_Report Conclusivo_27 08 2012-31 05 2013_rev5	X	
19/07/13	documenti calcoli FEM		X
20/07/13	Relazione settimanale 13-19 luglio ed allegati	X	
22/07/13	Comunicazione temporanea rimozione correntometro fisso		
24/07/13	Report monitoraggio correntometria, parametri fissi, trappole sedimenti	X	



Rimozione Costa Concordia
Relazione Settimanale

Rev.0

Pag. 21/34

25/07/13	Piano Gestione Sedimenti e allegati	X	X
	Piano Gestione Acque Interne fase WP6	X	X
	Envid per fase WP6	X	X
27/07/13	Relazione settimanale 20-26 luglio ed allegati	X	
03/08/13	Relazione settimanale 27 luglio-02 agosto ed allegati	X	
05/08/13	Aggiornamento Piano Gestione Acque Interne	X	X
07/08/13	Documentazione WP6 e WP6 bis	X	X
10/08/13	Relazione settimanale 03-09 agosto ed allegati	X	
	12-343-H45_rev0_Data report Rilievo Naturalistico 25-26 Giugno 2013	X	
	12-343-H46_rev0_Report Monitoraggio QA Giugno 2013	X	
17/08/13	Relazione settimanale 10-16 agosto ed allegati	X	
24/08/13	Relazione settimanale 17-23 agosto ed allegati	X	
31/08/13	Relazione settimanale 24-30 agosto ed allegati	X	
	Rapporto ecotossicologia pre parbuckling ed allegati	X	
	Report acque esterne I campagna ed allegati	X	
	Stato aggiornamento acque interne e risultati analisi	X	
02/09/13	Rapporto rimozione sedimenti	X	
	TMCC-TC-REP-30-1112-01 "Verifiche delle Piattaforme e dei Tubi Addizionali di Ritenuta"		X
04/09/13	Integrazione rimozione sedimenti	X	
	Richiesta Laboratorio Ambiente sostituzione saggio biologico	X	
05/09/13	Aggiornamento relazione ambientale fase WP6bis	X	X

06/09/13	Manuale WP6bis rev 01	X	X
	Monitoraggio Ambientale durante il Parbuckling	X	
	WP6bis – comunicazione inizio attività		X
07/09/13	Relazione settimanale 31 agosto-06 settembre ed allegati	X	
	12-343-H49_Rev0 Report monitoraggio QA Luglio 2013	X	
08/09/13	Stato aggiornamento acque interne e risultati analisi	X	
11/09/13	Addendum all'Aggiornamento Valutazioni Ambientali Fase WP6	X	
	Manuale WP6 rev.5		X
12/09/13	Traduzione Documenti Cetena		X
14/09/13	Relazione settimanale 07-13 settembre ed allegati	X	
	Report finale rimozione sedimenti	X	
21/09/13	Relazione settimanale 14-20 settembre ed allegati	X	
	12-343-H47 Rev0_Relazione naturalistica CO 2013.pdf	X	
28/09/13	Relazione settimanale 21-27 settembre ed allegati	X	
04/10/13	Presentazioni T/M e UniRoma con relazione illustrativa		
05/10/13	Relazione settimanale 28 settembre-04 ottobre ed allegati	X	
	12-343-H52_REV0 Report Monitoraggio QA Agosto 2013	X	
	Mappa Biocenosi Agosto 2013	X	
12/10/13	Relazione settimanale 05-11 ottobre ed allegati	X	
19/10/13	Relazione settimanale 12-18 ottobre ed allegati	X	
26/10/13	Relazione settimanale 19-25 ottobre ed allegati	X	

	<p align="center">Rimozione Costa Concordia</p> <p align="center">Relazione Settimanale</p>	<p align="center">Rev.0</p>	<p align="center">Pag. 23/34</p>
---	---	------------------------------------	----------------------------------

<p>02/11/13</p>	<p>Relazione settimanale 26 ottobre – 01 novembre ed allegati</p>	<p align="center">X</p>	
------------------------	---	--------------------------------	--

ALLEGATO 4



Supporti Tubolari di collegamento tra piattaforme e cassoni





UNDERWATER NOISE AND CETACEAN MONITORING

Report di attività, 26 ottobre – 01 novembre 2013

1. ZONA DI ESCLUSIONE

- A seguito delle registrazioni delle attrezzature man mano utilizzate dal cantiere in questi mesi (*vibratory hammer*, fresa, *impact hammer*, trivella, etc) e della tipologia di rumore prodotto (impulsivo, non impulsivo, periodico, non periodico, etc), è stata definita e applicata una zona di esclusione (o area di sicurezza) per i cetacei a 1000m di raggio intorno alla nave Concordia (Fig. 1), al fine di:
 - 1) determinare la presenza/assenza dei cetacei nell'area in prossimità del cantiere (sorgente del rumore),
 - 2) comprendere se le emissioni sonore nelle immediate vicinanze sono compatibili con le esigenze di protezione di queste specie,
 - 3) determinare lo stato acustico dell'ambiente durante il periodo di rimozione (definizione di 'paesaggi acustici' in relazione alle diverse fasi),
 - 4) attuare eventuali misure di mitigazione.

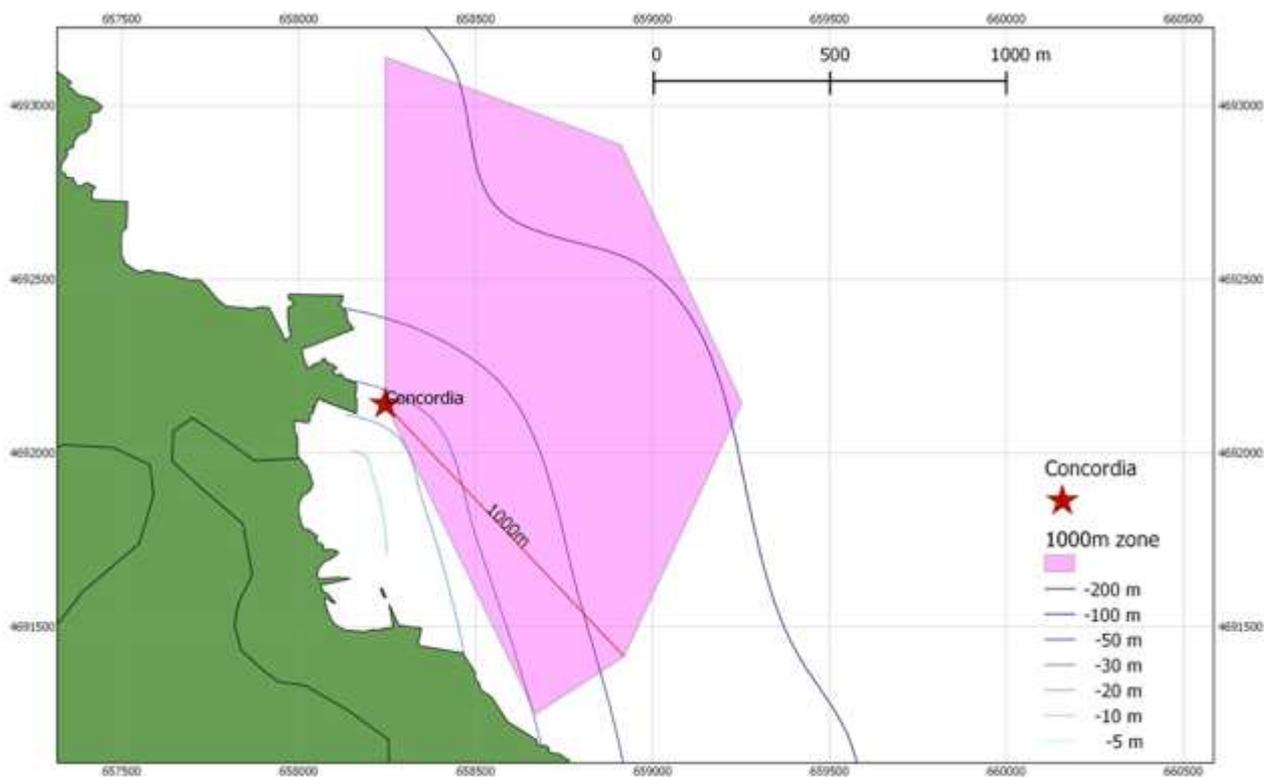


Figura 1. Zona di esclusione (area di sicurezza) per i cetacei

2. MONITORAGGIO ACUSTICO (RUMORE E CETACEI): STAZIONI

- Sono state identificate 14 stazioni di rilevamento acustico (ascolto e/o registrazione tramite idrofono Colmar GP0280 SN103 calibrato quotidianamente) poste a nel raggio di 250m, 500m e 1000m dalla nave (Fig. 2).

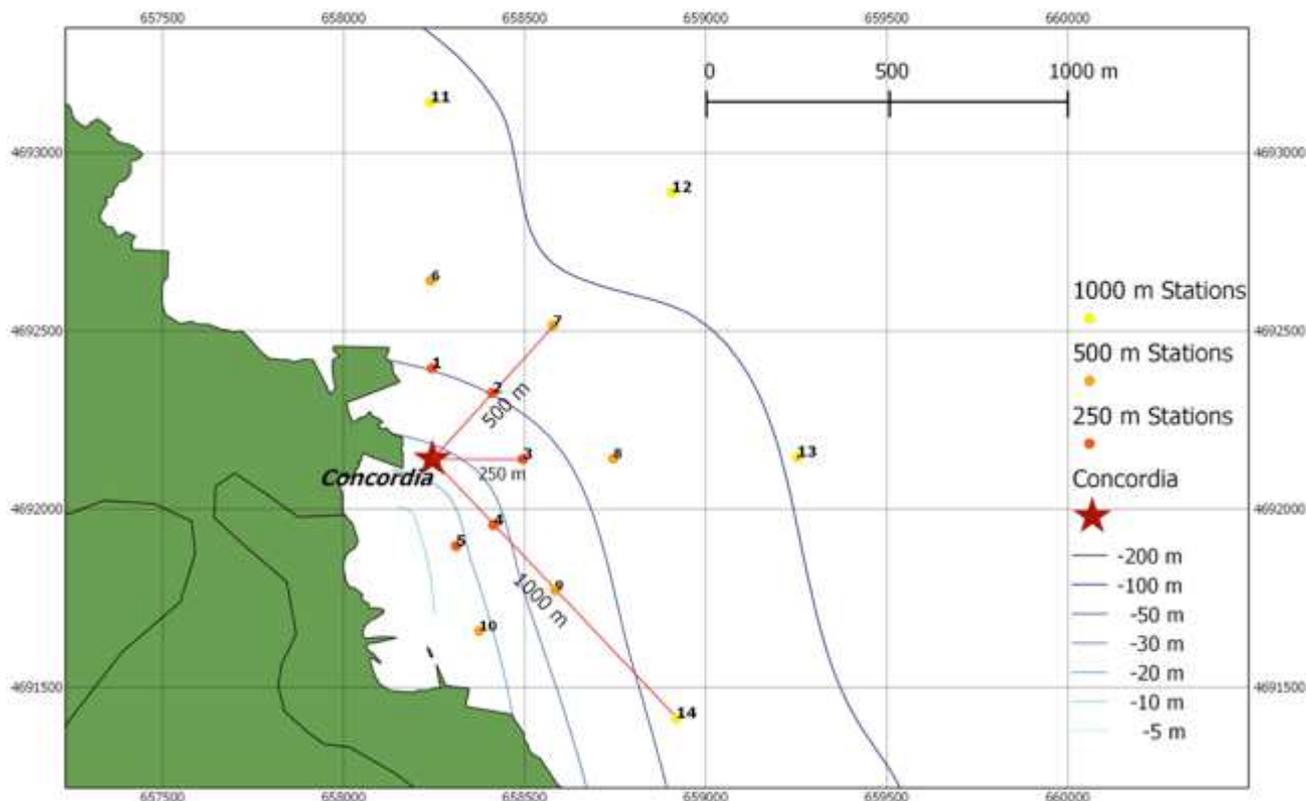


Figura 2. Stazioni acustiche a 250m, 500m e 1000m dalla nave.

- Il piano di lavoro prevede che durante la settimana siano quotidianamente campionate almeno 2 stazioni (ascolto e/o registrazione), in maniera da raccogliere: a) dati sufficienti alla definizione del paesaggio acustico relativo a questa fase dei lavori di rimozione (inclusa la stima visiva del traffico di imbarcazioni intorno alla stazione di registrazione) e b) informazioni sulla eventuale presenza di cetacei nella zona; non sono stati condotti i rilevamenti in caso di condizioni meteo-marine tali da non garantire il corretto svolgimento del campionamento e la sicurezza degli operatori.
- Le stazioni da campionare sono state selezionate con criteri di opportunità (es. condizioni meteo-marine, correnti, etc).
- Ogni campionamento acustico è stato generalmente effettuato a 5 profondità (5, 10, 20, 30 e 50m), con registrazioni di 3 minuti ognuna; in caso di solo ascolto, la durata complessiva del rilevamento era di 10 minuti.
- Durante la settimana, a causa di condizioni meteo marine particolarmente sfavorevoli, sono state campionate solo **2 stazioni** (Tabella 1) il giorno 26 ottobre, per un totale di **30 minuti di registrazione**.

**Tabella 1. Stazioni acustiche campionate nel corso della settimana
26 ottobre - 01 novembre 2013.**

Distanza dalla nave	250m					500m					
	Stazione #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.10.2013		X								X	
27.10.2013*											
28.10.2013*											
29.10.2013*											
30.10.2013*											
31.10.2013*											
01.11.2013*											

* stazioni non campionate a causa di condizioni meteo marine non favorevoli (forti correnti o elevato moto ondoso)

3. MONITORAGGIO ACUSTICO (RUMORE DI CANTIERE): MISURE E RISULTATI

- Normalmente, le misure acustiche hanno riguardato SPLs (sound pressure levels) misurati in dB re. 1µPa, normalizzati alla distanza di 500m ed espressi come:
 - Mean sound level, mediato sull'intero spettro campionato (5-48.000Hz) al fine di definire e monitorare il **rumore di fondo** (*background noise*), ovvero la somma del rumore biologico e del rumore antropogenico.
 - Peak sound level: $L_{peak} = 20 \text{ LOG}(p_{peak}/p_0)$ in dB re. $p_0 = 1\mu\text{Pa}$, in ciascuna della 4 bande di frequenza dello spettro (10-100 Hz, 100-1.000 Hz, 1.000-20.000 Hz, 20.000-48.000) alle differenti profondità. Queste misure sono calcolate al fine di definire e monitorare **sia il rumore del traffico di imbarcazioni, sia quello del martello** se presente (*boat traffic and pile driving noise*)
 - Root Mean Square (RMS) sound level: $L_{rms} = 20 \text{ LOG}(p_{rms}/p_0)$ in dB re. $p_0 = 1\mu\text{Pa}$, nelle prime 3 bande di frequenza dello spettro (10-100 Hz, 100-1.000 Hz, 1.000-20.000 Hz) alle differenti profondità. Queste misure sono calcolate al fine di caratterizzare lo scenario acustico in presenza di **suoni impulsivi quasi-periodici** (*quasi-periodic impulsive sound, i.e. blow rate*)
- Le seguenti soglie sono state considerate come riferimento per il monitoraggio acustico del rumore in relazione all'estensione della EZ (500m dalla nave) per i cetacei (per i dettagli, vedi report tecnico relativo al modello acustico):

Mean sound level = 120 dB re dB re. 1µPa

$L_{peak} = 180 \text{ dB re dB re. } 1\mu\text{Pa}$

$L_{rms} = 180 \text{ dB re dB re. } 1\mu\text{Pa rms (danni fisici ai cetacei)}$

$L_{rms} = 160 \text{ dB re dB re. } 1\mu\text{Pa rms (effetti comportamentali sui cetacei)}$

- Per quanto riguarda il **Mean sound level**, utile alla rappresentazione del rumore di fondo, il trend della settimana relativo alle 2 stazioni campionate (Tabella 1) è riportato in Figura 3. Questa settimana i valori sono generalmente entro la soglia di 120 dB (o poco superiori a 20m di profondità) nell'ambito della EZ di 1000m dalla nave.

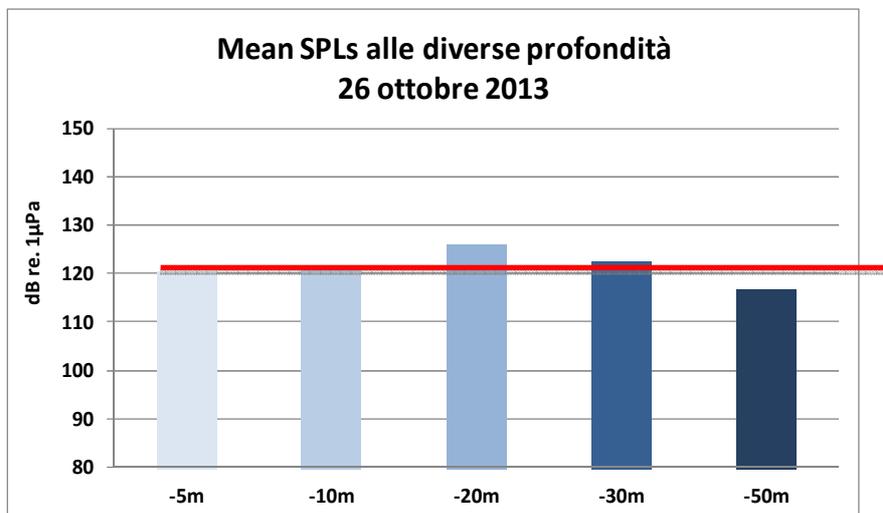


Figura 3. Mean Sound Level: andamento dei valori registrati il 26 ottobre 2013 alle diverse profondità (per la zona di esclusione di 1000m dalla nave, la barra rossa rappresenta il valore soglia).

- Per quanto riguarda i valori di picco (**Peak sound level**), utili alla rappresentazione del rumore provocato dal traffico delle imbarcazioni e dall'attività di cantiere, i valori delle 2 stazioni campionate durante la settimana sono riportati in Figura 4. I valori medi settimanali sono entro i 180 dB (soglia per i danni fisici qualora vengano rilevati cetacei nella EZ, ovvero entro il raggio di 1000m dalla nave) e oltre i 160 dB (soglia per effetti comportamentali qualora vengano rilevati cetacei nella EZ, ovvero entro il raggio di 1000m dalla nave) nella banda di frequenza più bassa (10-100 Hz). La propagazione dei rumori (e quindi la loro percezione) su queste frequenze avviene per lunghe distanze (range 10-25km).

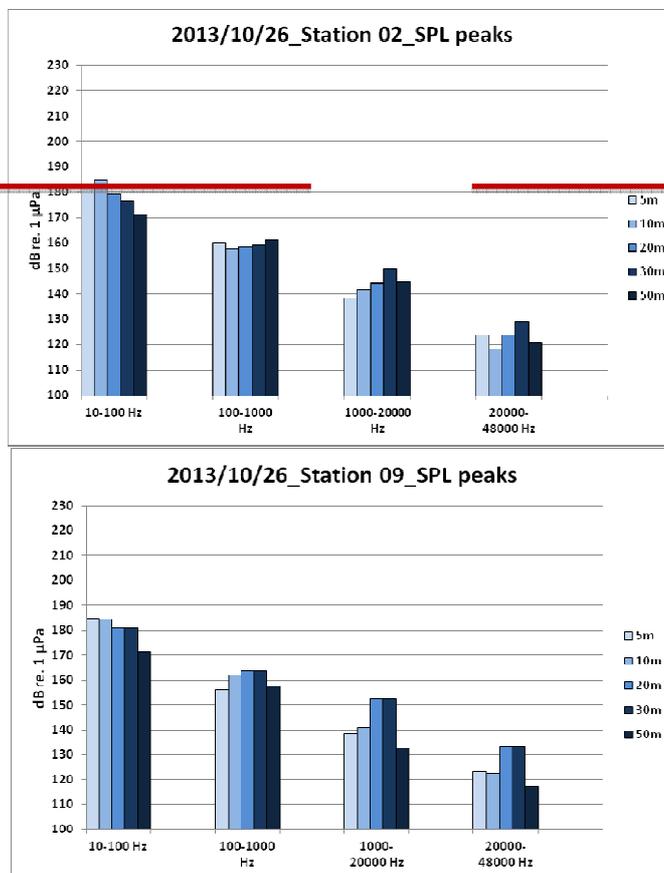


Figura 4. Peak sound level: andamento dei valori alle varie profondità per le diverse bande di frequenza nelle 2 stazioni campionate il 26 ottobre 2013 (per la zona di esclusione di 1000m dalla nave, la barra rossa rappresenta il valore soglia per i danni fisici ai cetacei).

- Per quanto riguarda i valori di rms (**Root Mean Square** sound level), utili a caratterizzare lo scenario acustico in presenza di suoni impulsivi quasi-periodici come il martello, i valori delle 2 stazioni campionate durante la settimana sono riportati in Figura 5. Sono stati generalmente rilevati valori al di sotto dei 180 dB (soglia per i danni fisici qualora vengano rilevati cetacei nella EZ, ovvero entro il raggio di 1000m dalla nave) e entro i 160 dB (soglia per effetti comportamentali qualora vengano rilevati cetacei nella EZ, ovvero entro il raggio di 1000m dalla nave) nella banda di frequenza più bassa (10-100 Hz).

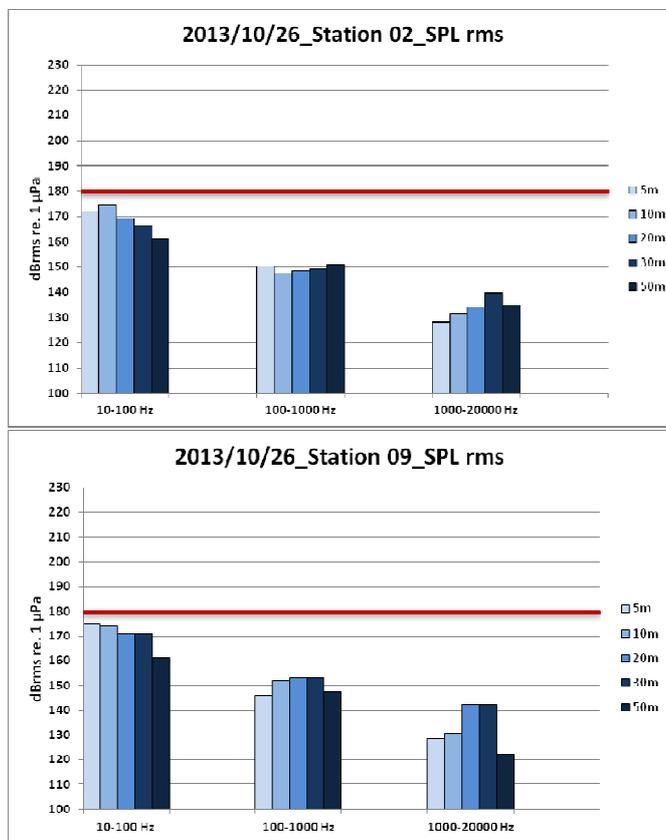


Figura 5. Rms sound level: andamento dei valori alle varie profondità per le diverse bande di frequenza nelle 2 stazioni campionate il 26 ottobre 2013 (per la zona di esclusione di 1000m dalla nave, la barra rossa rappresenta il valore soglia per i danni fisici ai cetacei).

4. MONITORAGGIO ACUSTICO (VOCALIZZAZIONI CETACEI): MISURE E RISULTATI

- La rilevazione acustica e visiva di delfini in occasione della detonazione dell'ordigno bellico il 21/11/2012 ha fornito lo spunto per verificare sistematicamente l'eventuale presenza di cetofauna a una distanza almeno due volte superiore all'attuale zona di esclusione (ovvero a una distanza di oltre 2.000 metri dalla nave). Sono state quindi effettuate alcune prove di ascolto e registrazione specifiche lungo il perimetro esterno, sezione nord, del transetto per il monitoraggio visivo nella settimana 24-30 novembre 2012 e sono stati rilevati una serie di suoni di diverse tipologie riconducibili a fischi e click di delfini.
- E' stato quindi definito un **protocollo di monitoraggio acustico (specifico per i cetacei)** standardizzato in determinate posizioni lontane del cantiere (al fine di ridurre l'intensità del rumore da lì proveniente) per una più puntuale (eventuale) localizzazione acustica dei cetacei potenzialmente presenti, al fine di:
 - 1) integrare il monitoraggio visivo della presenza dei cetacei nell'area e
 - 2) arricchire il monitoraggio dei rumori di cantiere con l'acquisizione di informazioni acustiche specifiche sulla possibile (concomitante) presenza di animali nella zona.
- Il metodo di acquisizione dei dati acustici prevede che durante il transetto del monitoraggio visivo a Nord (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L), siano effettuate 2 tappe di ascolto/registrazione presso i punti A, F e/o L e durante il transetto a Sud (L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V) presso i punti V e P (vedi figura 6); tuttavia, a seconda delle condizioni meteo-marine, questo schema generale può subire variazioni.
- L'idrofono è posizionato a 2 profondità, ovvero a 5 e a 30 metri, gain 20, e ciascuna registrazione ha la durata di 5 minuti.

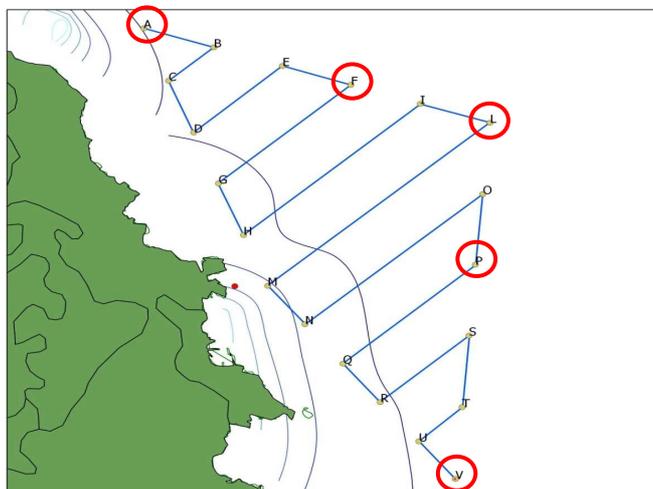


Figura 6. Punti di rilevazione acustica lungo il transetto del monitoraggio visivo.

- La sintesi dei punti campionati acusticamente per la presenza di cetacei in questa settimana (n=3) è riportata in tabella 3.

Tabella 3.

CETACEAN ACOUSTIC MONITORING					
Stazione #	A	F	L	P	V
26.10.2013					X
27.10.2013*					
28.10.2013*					
29.10.2013*					
30.10.2013*					
31.10.2013*					
01.11.2013	X	X			

* monitoraggio non effettuato a causa delle condizioni meteo-marine non idonee

- Nelle 3 stazioni campionate questa settimana **non sono stati registrati suoni riconducibili a queste specie.**

5. MONITORAGGIO VISIVO DEI CETACEI: MISURE E RISULTATI

- Il monitoraggio visivo della presenza dei cetacei nell'area viene generalmente effettuato a occhio nudo da MMO qualificati e certificati a bordo di una imbarcazione dedicata, utilizzando binocoli e apposite schede di avvistamento.
- Questa settimana per il monitoraggio è stata utilizzata l'imbarcazione 'Spirit'.
- Per effettuare il monitoraggio quando lo stato del mare non consente l'uscita della barca è stata opportunamente individuata una postazione fissa (Figura 7), situata a una altitudine di 74m slm.
- Questa settimana **il monitoraggio è stato condotto esclusivamente in mare** (Tabella 4).



Figura 7. Postazione a terra per le attività di avvistamento cetacei (N 42° 21' 53.0" E 010° 55' 00.5")

- Il piano di lavoro prevede che durante la settimana sia quotidianamente osservata in dettaglio l'area dei 500-1000m intorno alla nave e che venga monitorata (a bordo dell'imbarcazione) anche una zona buffer entro il 2500m; non sono state condotte osservazioni in caso di condizioni meteo-marine tali da non garantire il corretto svolgimento del campionamento e la sicurezza degli operatori.
- In caso del monitoraggio da barca, le rotte seguite includevano: la EZ, le stazioni acustiche da campionare e, nell'ambito del raggio dei 2500m dalla nave, il transetto lineare riportato in Figura 8.

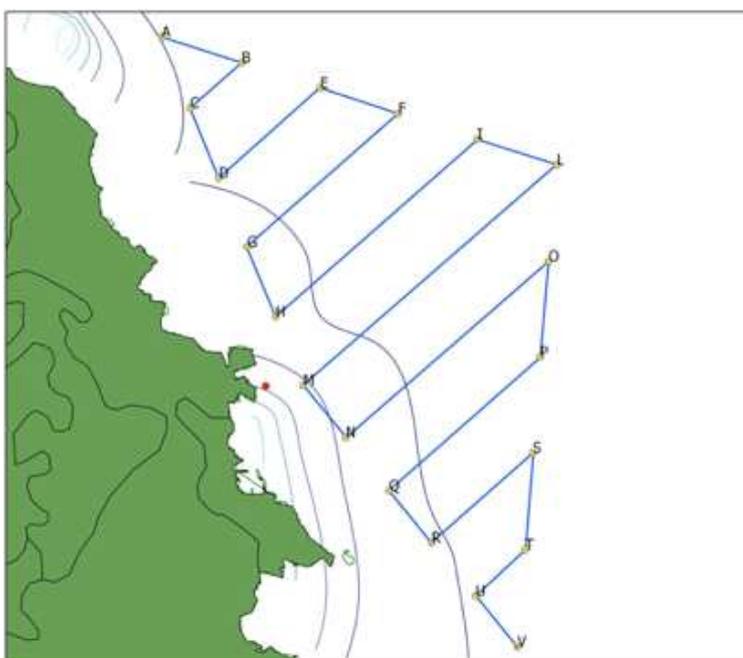


Figura 8. Transetti lineari seguiti durante le attività di avvistamento cetacei.

La Tabella 4 riporta la sintesi delle informazioni raccolte. Durante la settimana è stata monitorata l'intera area a 2500m di distanza dalla Costa Concordia con periodi di osservazione in mare mattutini e pomeridiani (Tabella 4).

Lo sforzo di osservazione totale è di 1110 min (Tabella 4) e di 130,95 km percorsi (Figura 9).
Non è stato effettuato alcun avvistamento né all'interno della zona di esclusione né nel raggio di 2500m dal relitto.

Tabella 4. Sintesi dello sforzo di avvistamento e delle condizioni meteo marine nel corso della settimana 26 ottobre 2013 – 01 novembre 2013

DATE	TIME		PLACE OF MONITORING		EFFORT (km)	VESSEL SPEED (kn)	VISIBILITY	WIND		SEA STATE	TEMPERATURE		WEATHER
	Start	End	AT SEA	LAND				Speed (kn)	Direction		AIR	SEA	
26.10.2013	09:05	12:04	X	-	22,65	4	Good	11	135	2	20,6	21,1	Partly Cloudy
26.10.2013	15:29	17:26	X	-	8,43	4	Good	5	135	1	20,8	21,2	Partly Cloudy
27.10.2013	09:00	10:41	X	-	10,55	4	Good	6	90	2 3	21	21,1	Cloudy
27.10.2013	15:00	16:17	X	-	8,98	4	Good	15	135	3	21	21,1	Cloudy
28.10.2013	09:15	10:36	X	-	10,27	4	Good	12	180	3	21	21	Partly Cloudy
28.10.2013	15:05	16:44	X	-	13,45	4	Good	8,5	180	3	21	21	Partly Cloudy
29.10.2013*	-	-	-	-	-	-	Good	19	135	3	21	21,1	Partly Cloudy
29.10.2013	15:35	16:43	X	-	9,25	4	Good	16	135	3	21,1	21,1	Partly Cloudy
30.10.2013*	-	-	-	-	-	-	Good	12	90	3	20,6	21,1	Cloudy
30.10.2013*	-	-	-	-	-	-	Good	8	135	3	21,2	21,2	Cloudy
31.10.2013	09:25	12:08	X	-	14,52	4	Good	6	45	2 3	20	21	Fair
31.10.2013	15:08	17:17	X	-	22,47	4	Good	2	45	1 2	21	20,7	Partly Cloudy
01.11.2013*	-	-	-	-	-	-	Good	6	90	3	19	20,7	Cloudy
01.11.2013	15:35	17:11	X	-	10,38	4	Good	6	135	1 2	21	20,7	Cloudy



Figura 9. Rotte seguite durante il monitoraggio visivo in barca (26.10.2013 – 01.11.2013).



Rimozione Costa Concordia

Relazione Settimanale

Rev.0

Pag. 34/34

6. GRUPPO DI LAVORO

Surname	Name	Professional Background	Role in the program	MMO certificate
Pace	Daniela Silvia	Marine Biologist, Cetologist	Team Supervisor	YES
Azzali	Massimo	Acoustic Engineer	Acoustic Expert and data analysis	NO
Mussi	Barbara	Cetologist	GIS Expert and data analysis	YES
Vigna	Leonardo	Technician	Data analysis	YES
Mariani	Monica	Biologist	Fieldwork and data collection (ON-SITE)	YES
Giacomini	Giancarlo	Environmental Acoustic Technician	Fieldwork and data collection (ON-SITE)	YES

NOTE CONCLUSIVE

- Anche durante questa settimana è stata applicata la zona di esclusione (EZ) di 1000m dalla nave.
- Non è stato effettuato alcun avvistamento né all'interno della zona di esclusione né nella zona buffer a 2500m dal relitto della Costa Concordia.
- Anche questa **settimana sono stati riscontrati valori di Mean SPL entro (o poco oltre) la soglia dei 120 dB, essendo notevolmente diminuito il traffico di imbarcazioni (diporto, traghetti) e dei mezzi navali del cantiere.**
- Come già evidenziato in passato, durante le prossime due-tre settimane, compatibilmente con le condizioni meteo-marine, si effettuerà:
 - 1) il monitoraggio acustico del rumore attraverso l'ascolto e/o la registrazione quotidiana sulle 10 stazioni definite in precedenza secondo il protocollo standard e, eventualmente, sulle altre 4 identificate nel raggio di 1000m dalla nave, fermo restando che ogni qualvolta vengano rilevati rumori particolari si procederà alla loro registrazione e analisi
 - 2) il monitoraggio visivo/acustico quotidiano, con survey in barca, della presenza dei cetacei nella EZ, nella zona buffer e, una volta a settimana (condizioni meteo permettendo), nel corso di un periplo dell'isola;
 - 3) un eventuale aggiornamento del modello acustico di propagazione attraverso l'inserimento di nuovi parametri e dei risultati delle analisi delle registrazioni sul campo, se sarà necessario definire una nuova zona di esclusione
 - 4) una verifica delle eventuali strategie di mitigazione dell'impatto del rumore sulle specie di cetacei potenzialmente presenti nell'area (se applicate).



COSTA CONCORDIA WRECK REMOVAL

1-month lookout

ID	Task Name	Start	Finish	Duration	November 2013																											
					S02	S03	M04	T05	W06	T07	F08	S09	S10	M11	T12	W13	T14	F15	S16	S17	M18	T19	W20	T21	F22	S23	S24	M25	T26	W27	T28	F29
5	5 Component No. 5: PARBUCKLE	Tue 17.09.13	Wed 21.05.14	246 days	[Gantt bar]																											
21	5.3 Component No. 6 a: WINTERISATION CARETAKING	Fri 20.09.13	Mon 02.12.13	73,82 days	[Gantt bar]																											
22	5.3.1 Winterisation Stabilization	Fri 20.09.13	Mon 02.12.13	73,82 days	[Gantt bar]																											
35	5.3.1.7 Grouting operations for Winterisation	Sun 29.09.13	Thu 14.11.13	46 days	[Gantt bar]																											
37	5.3.1.7.2 Install grout stopper frames 236 to 272	Sat 19.10.13	Mon 04.11.13	16 days	[Gantt bar]																											
40	5.3.1.7.5 Grout bow support pyramide (app. 900m3)	Mon 04.11.13	Thu 14.11.13	10 days	[Gantt bar]																											
41	5.3.1.7.6 Reinforce platforms for winterisation loads	Sun 29.09.13	Sun 03.11.13	35 days	[Gantt bar]																											
47	5.3.1.7.6.6 Grout defined members of PF 3 (3 Diagonal)	Sat 02.11.13	Sun 03.11.13	1 day	[Gantt bar]																											
50	5.3.1.8 Winterisation of BCS	Sun 22.09.13	Mon 02.12.13	70 days	[Gantt bar]																											
51	5.3.1.8.1 Prepare PS sponson BCS for winter	Sun 22.09.13	Tue 26.11.13	64,33 days	[Gantt bar]																											
55	5.3.1.8.1.4 Clean up debris on top of submerged sponsons	Sat 02.11.13	Tue 12.11.13	10 days	[Gantt bar]																											
56	5.3.1.8.1.5 Remove top deck valves on sponsons	Tue 12.11.13	Tue 26.11.13	2 wks	[Gantt bar]																											
57	5.3.1.8.2 Prepare blister BCS for winter	Fri 15.11.13	Mon 02.12.13	17 days	[Gantt bar]																											
58	5.3.1.9 Tie down of CC / Anchor ops	Fri 20.09.13	Mon 02.12.13	73,82 days	[Gantt bar]																											
59	5.3.1.9.1 Install tubular braces to platforms	Fri 20.09.13	Mon 18.11.13	59,82 days	[Gantt bar]																											
96	5.3.1.9.1.9 Grout connection sleeves of PF 3 braces	Sat 02.11.13	Sun 03.11.13	1 day	[Gantt bar]																											
97	5.3.1.9.1.10 Secure all bolts on sponson braces	Sat 02.11.13	Sat 09.11.13	1 wk	[Gantt bar]																											
98	5.3.1.9.1.11 Commission Strain gauges	Mon 11.11.13	Mon 18.11.13	1 wk	[Gantt bar]																											
100	5.3.1.9.3 Lock Strand bundles of long sponsons, remove SJs	Mon 18.11.13	Mon 02.12.13	2 wks	[Gantt bar]																											
101	5.3.1.9.4 Load cells on HB towers	Wed 13.11.13	Wed 20.11.13	1 wk	[Gantt bar]																											
102	5.3.1.9.5 Re-connect CC own anchors	Wed 20.11.13	Sun 24.11.13	4 days	[Gantt bar]																											
103	5.3.1.9.6 Bow Retaining Line	Fri 25.10.13	Wed 20.11.13	26 days	[Gantt bar]																											
105	5.3.1.9.6.2 Rigging of grommets around blister	Tue 05.11.13	Thu 07.11.13	2 days	[Gantt bar]																											
106	5.3.1.9.6.3 Placing of bottom anchors	Wed 06.11.13	Mon 11.11.13	5 days	[Gantt bar]																											
107	5.3.1.9.6.4 Rigging of inshore rock	Mon 11.11.13	Wed 13.11.13	2 days	[Gantt bar]																											
108	5.3.1.9.6.5 Installation of tubulars	Wed 13.11.13	Wed 20.11.13	1 wk	[Gantt bar]																											
109	5.3.1.10 Works on the CC	Mon 23.09.13	Wed 27.11.13	64,62 days	[Gantt bar]																											
111	5.3.1.10.2 Drill crack arrest holes	Sat 02.11.13	Sat 09.11.13	7 days	[Gantt bar]																											
112	5.3.1.10.3 Interior access/Valuables retrieval	Wed 30.10.13	Wed 27.11.13	4 wks	[Gantt bar]																											
120	5.5 Refloat preparations pre Spring Start up	Tue 24.09.13	Wed 01.01.14	99,33 days	[Gantt bar]																											
122	5.5.2 Relocate Fagioli equipment from Nav 2 to M61	Fri 01.11.13	Fri 08.11.13	1 wk	[Gantt bar]																											
125	5.5.5 Pass remaining chains under CC	Mon 30.09.13	Tue 26.11.13	56,67 days	[Gantt bar]																											
131	5.5.5.6 Pull 4 chains for S4 Bow area	Wed 30.10.13	Mon 11.11.13	11,67 days	[Gantt bar]																											
133	5.5.5.6.2 Pull chain 228	Sat 09.11.13	Sun 10.11.13	1 day	[Gantt bar]																											
134	5.5.5.6.3 Pull chain 232	Sun 10.11.13	Mon 11.11.13	1 day	[Gantt bar]																											
135	5.5.5.7 Pull 4 chains for S12	Wed 30.10.13	Tue 26.11.13	26,67 days	[Gantt bar]																											
137	5.5.5.7.2 Pull chain IWO 108	Sun 24.11.13	Tue 26.11.13	2 days	[Gantt bar]																											
138	5.5.5.8 Tighten chains 280 & 288 for pyramid grouting	Thu 07.11.13	Sat 09.11.13	2 days	[Gantt bar]																											
141	5.5.6 Install Bilge plates for chains passed during winter	Wed 30.10.13	Sat 16.11.13	17 days	[Gantt bar]																											
143	5.5.6.2 Install bilge plate frame 232	Mon 11.11.13	Wed 13.11.13	2,5 days	[Gantt bar]																											
144	5.5.6.3 Install bilge plate frame 228	Wed 13.11.13	Sat 16.11.13	2,5 days	[Gantt bar]																											
145	5.5.6.4 Install bilge plate frame 224	Sat 02.11.13	Mon 04.11.13	2,5 days	[Gantt bar]																											
146	5.5.6.5 Install bilge plate frame 220	Mon 04.11.13	Thu 07.11.13	2,5 days	[Gantt bar]																											
147	5.5.7 Deal with SB damage mitigation FWD (trimming, surveying, engir	Fri 01.11.13	Sun 01.12.13	1 mon	[Gantt bar]																											
148	5.5.8 Remove balconies in fwd damage area	Sat 02.11.13	Wed 01.01.14	2 mons	[Gantt bar]																											
149	5.5.9 Deal with SB damage mitigation AFT (trimming, surveying, engin	Fri 01.11.13	Sun 01.12.13	1 mon	[Gantt bar]																											
150	5.5.10 Remove balconies in aft damage area	Sat 02.11.13	Wed 01.01.14	2 mons	[Gantt bar]																											
151	5.5.11 Remove rudders of CC	Wed 20.11.13	Sun 01.12.13	11 days	[Gantt bar]																											
152	5.5.11.1 Install platforms and rigging	Wed 20.11.13	Wed 27.11.13	1 wk	[Gantt bar]																											
153	5.5.11.2 Remove PS rudder	Fri 29.11.13	Sun 01.12.13	2 days	[Gantt bar]																											
154	5.5.11.3 Remove SB rudder	Wed 27.11.13	Fri 29.11.13	2 days	[Gantt bar]																											
313	6.18 Works on Ballast Control System	Tue 01.10.13	Tue 29.04.14	210 days	[Gantt bar]																											
328	6.18.3 BCS installations on CC prior to refloat	Tue 01.10.13	Tue 29.04.14	210 days	[Gantt bar]																											
330	6.18.3.2 Installation of EPPMU's etc on CC	Wed 20.11.13	Wed 18.12.13	4 wks	[Gantt bar]																											
331	6.18.3.3 Installation of Power grid on CC	Sat 01.02.14	Sat 22.02.14	3 wks	[Gantt bar]																											



COSTA CONCORDIA WRECK REMOVAL

1-month lookout

ID	Task Name	Start	Finish	Duration	November 2013																											
					S02	S03	M04	T05	W06	T07	F08	S09	S10	M11	T12	W13	T14	F15	S16	S17	M18	T19	W20	T21	F22	S23	S24	M25	T26	W27	T28	F29
332	6.18.3.4 Installation of main air system on CC	Thu 31.10.13	Thu 09.01.14	10 wks																												
